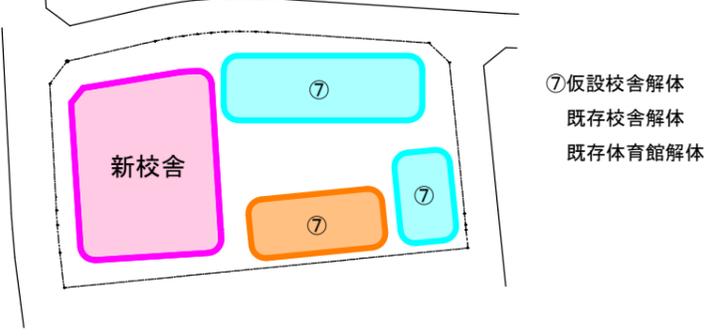
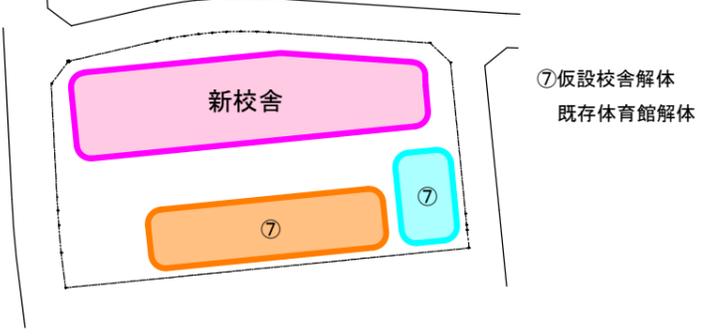
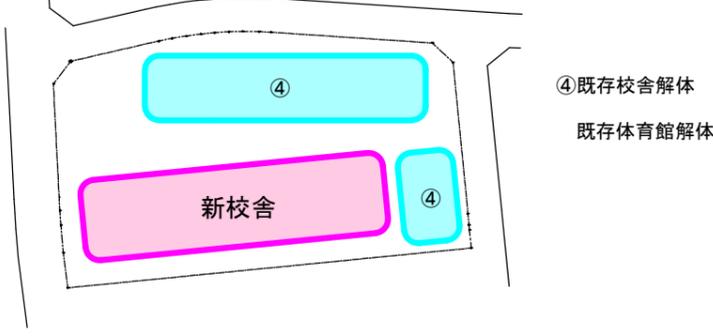
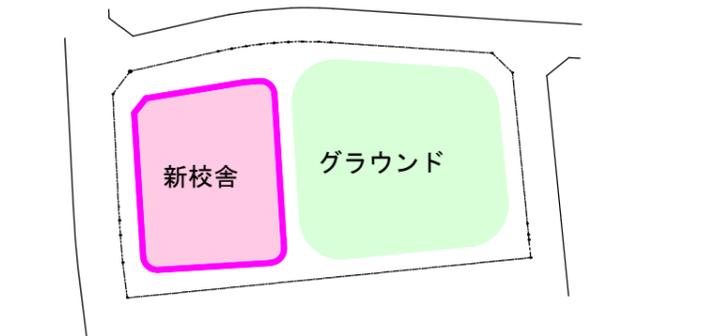
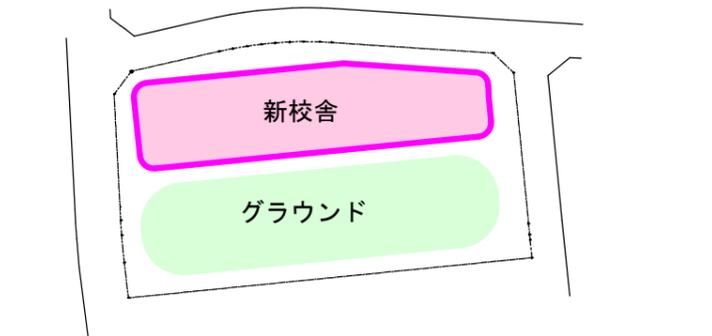
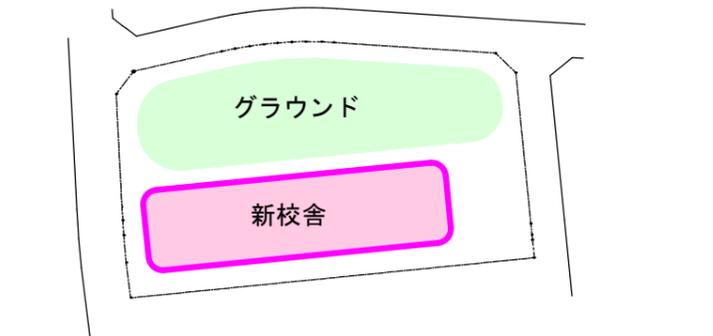
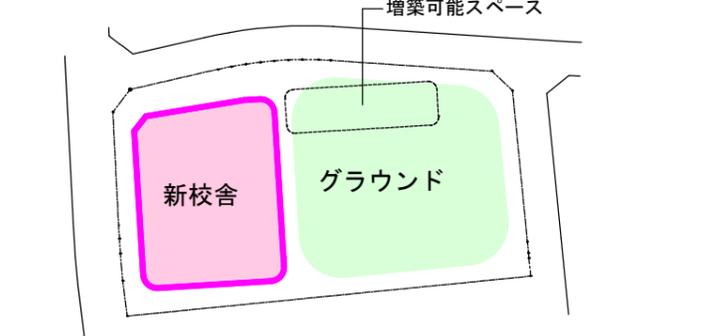
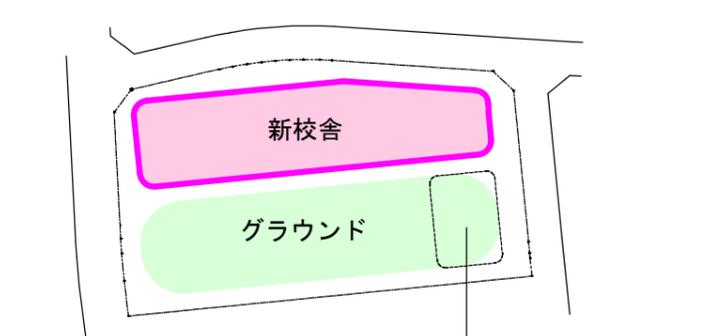
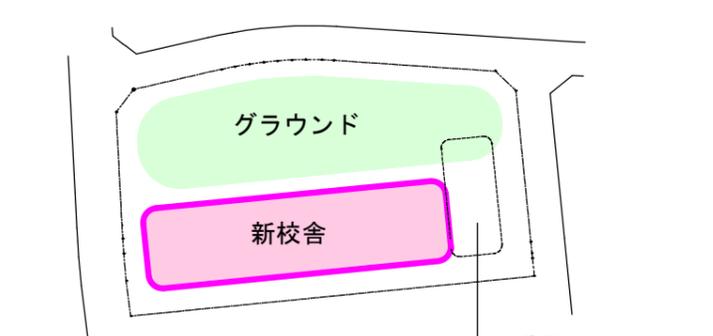


新校舎完成までの工事ステップ図 (1/2)

	想定工期	A案 新校舎西配置	想定工期	B案 新校舎北配置	想定工期	C案 新校舎南配置
第一期工事	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ① プール解体 ② 仮設校舎建設 ③ 一部引越し ④ 既存(蜂の巣)校舎解体 	8ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ① プール解体 ② 仮設校舎建設 ③ 引越し 	2ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ① プール解体
		↓	5ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ④ 既存校舎解体 	↓	
	25ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ⑤ 新校舎建設 ⑥ 引越し 	26ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ⑤ 新校舎建設 ⑥ 引越し 	26ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ② 新校舎建設 ③ 引越し
第一期工事・工期合計		34ヶ月		39ヶ月		28ヶ月

新校舎完成までの工事ステップ図 (2 / 2)

	想定工期	A 案 新校舎西配置	想定工期	B 案 新校舎北配置	想定工期	C 案 新校舎南配置
第二期工事	5 ヶ月	 <p>⑦仮設校舎解体 既存校舎解体 既存体育館解体</p>	3 ヶ月	 <p>⑦仮設校舎解体 既存体育館解体</p>	5 ヶ月	 <p>④既存校舎解体 既存体育館解体</p>
	3 ヶ月	 <p>新校舎 グラウンド</p>	3 ヶ月	 <p>新校舎 グラウンド</p>	3 ヶ月	 <p>グラウンド 新校舎</p>
第二期工事・工期合計		8 ヶ月		6 ヶ月		8 ヶ月
全体工期合計		42 ヶ月		45 ヶ月		36 ヶ月
整備後		 <p>新校舎 グラウンド 増築可能スペース</p>		 <p>新校舎 グラウンド 増築可能スペース</p>		 <p>グラウンド 新校舎 増築可能スペース</p>
