

令和5年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和6年1月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立深大寺小学校給食室改修工事	給食室改修工事	121,000,000円	R5.6.22	林建設(株)	68%	56%	参考写真 No.1
				R5.6.23 ～ R6.3.22				
2	調布市立深大寺小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	30,250,000円	R5.6.22	(株)大東電設	63%	42%	
				R5.6.23 ～ R6.3.22				
3	調布市立深大寺小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	146,850,000円	R5.6.22	宮沢設備工業(株)	58%	40%	
				R5.6.23 ～ R6.3.22				
4	調布市立神代中学校体育館外部改修工事	体育館外部改修工事	76,613,900円	R5.6.27	(株)川又工務店	100%	98%	完了検査 12月15日
				R5.6.28 ～ R5.12.15				
5	調布市立第三中学校第一体育館改修工事	体育館外部及び内部改修工事	194,700,000円	R5.7.5	林建設(株)	76%	62%	参考写真 No.2
				R5.7.6 ～ R6.2.16				
6	調布市立第三中学校第一体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	47,294,500円	R5.7.5	いわき電工(株)本店	85%	78%	
				R5.7.6 ～ R6.2.16				
7	調布市立石原小学校給食室改修工事	給食室改修工事	149,050,000円	R5.7.5	相互建設(株)	65%	58%	参考写真 No.3
				R5.7.6 ～ R6.3.22				
8	調布市立石原小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	33,715,000円	R5.7.5	深電工業(株)	55%	45%	
				R5.7.6 ～ R6.3.22				
9	調布市立石原小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	180,763,000円	R5.7.5	宮沢設備工業(株)	55%	45%	
				R5.7.6 ～ R6.3.22				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立多摩川小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	23,925,000円	R5.7.13	(株)東京建設コンサルタント	100%	99%	完了検査 12月14日
				R5.7.14 ～ R5.12.8				
11	調布市立北ノ台小学校特別支援学級教室整備工事	特別支援教室整備工事	28,600,000円	R5.10.18	(有)日本ハウジング	60%	20%	参考写真 No.4
				R5.10.19 ～ R6.1.31				
12	調布市立調和小学校校舎LED化改修工事(その2)	校舎LED化改修工事	32,835,000円	R5.11.22	園部電設(株)	10%	0%	
				R5.11.24 ～ R6.3.22				
13	調布市八ヶ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事	空調設備改修工事	196,460,000円	R4.12.21	大成温・宮越建設共同企業体	35%	20%	参考写真 No.5
				R4.12.22 ～ R6.3.15				
14	調布市八ヶ岳少年自然の家防災設備改修工事	防災設備改修工事	21,648,000円	R5.10.10	(株)磯原電気	10%	5%	
				R5.10.11 ～ R6.3.15				
15	調布市武者小路実篤記念館照明設備改修工事	照明設備改修工事	5,516,500円	R5.11.15	いわき電工(株)本店	98%	5%	参考写真 No.6
				R5.11.16 ～ R6.1.31				



No.1
調布市立深大寺小学校給食室改修工事
調理室内 施工状況



No.2
調布市立第三中学校第一体育館改修工事
アリーナ床フローリング 施工完了




No.3
調布市立石原小学校給食室改修工事
調理室内 施工状況



No.4
調布市立北ノ台小学校特別支援学級教室整備工事
内装 施工状況



No.5
調布市八ヶ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事
空調機設置 施工状況

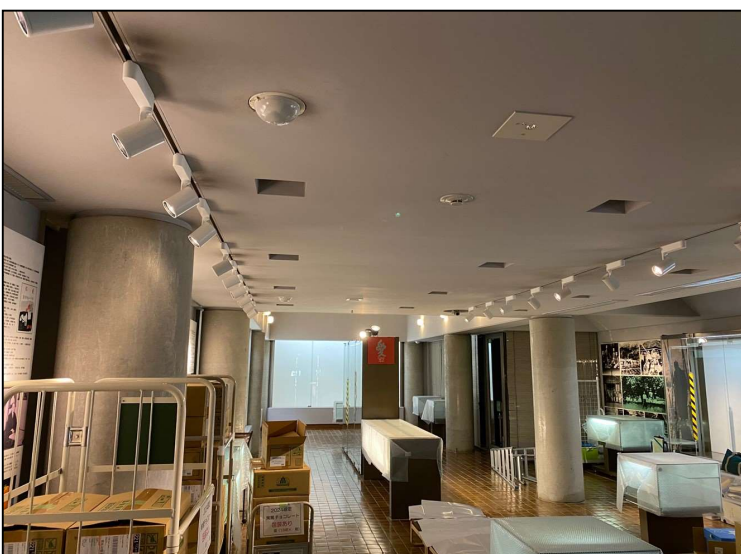

No.6
調布市武者小路実篤記念館照明設備改修工事
照明改修 施工状況
