

令和6年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和6年12月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立第一小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	73,040,000円	R6.3.15	(株)久保工務店	100%	99%	完了検査 11月13日
				R6.3.18 ～ R6.10.31				
2	調布市立神代中学校校庭整備工事	校庭整備工事	64,130,000円	R6.6.3	(株)井上グラ ンド施設工 事	100%	93%	完了検査 11月27日
				R6.6.4 ～ R6.11.29				
3	調布市立第三中学校校庭整備工事	校庭整備工事	45,426,700円	R6.6.11	(株)井上グラ ンド施設工 事	100%	93%	完了検査 11月15日
				R6.6.12 ～ R6.11.15				
4	調布市立八雲台小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	校舎外壁及び屋上防水改修工事	143,000,000円	R6.6.18	相互建設(株)	55%	45%	参考写真 No.1
				R6.6.19 ～ R7.3.18				
5	調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	校舎外壁及び屋上防水改修工事	259,600,000円	R6.6.20	林建設(株)	61%	48%	参考写真 No.2
				R6.6.21 ～ R7.3.18				
6	調布市立八雲台小学校給水管改修工事	給水管改修工事	40,810,000円	R6.7.4	(株)あかつき 設備	45%	40%	
				R6.7.5 ～ R7.3.18				
7	調布市立国領小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28,481,200円	R6.7.12	(株)磯原電気	0%	0%	
				R6.7.16 ～ R7.9.30				
8	調布市立柏野小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28,080,800円	R6.7.17	深電工業(株)	0%	0%	
				R6.7.18 ～ R7.9.25				
9	調布市立神代中学校格技棟改修工事	格技棟外部及び内部改修工事	104,500,000円	R6.7.26	(株)川又工務 店	57%	41%	参考写真 No.3
				R6.7.29 ～ R7.3.7				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立深大寺小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	8,241,200円	R6.8.2	(株)葉月商会	0%	0%	
				R6.8.5				
				R7.2.28				
11	調布市立八雲台小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	9,625,000円	R6.8.6	深電工業(株)	98%	0%	参考写真 No.4
				R6.8.7				
				R7.2.28				
12	調布市立第四中学校校庭整備工事	校庭整備工事	28,600,000円	R6.11.6	(株)井上グラ ンド施設工 事	17%	0%	参考写真 No.5
				R6.11.7				
				R7.3.14				
13	調布市立石原小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	16,801,840円	R6.11.14	(株)磯原電気	0%	-	
				R6.11.15				
				R7.2.28				
14	調布市立第七中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	15,440,700円	R6.11.14	園部電設(株)	0%	-	
				R6.11.15				
				R7.2.28				
15	調布市立深大寺小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	12,089,000円	R6.11.15	(株)大東電設	0%	-	
				R6.11.18				
				R7.2.28				
16	調布市立第八中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	11,000,000円	R6.11.15	小林電気(株)	0%	-	
				R6.11.18				
				R7.2.28				
17	調布市立飛田給小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	12,684,100円	R6.11.20	深電工業(株)	0%	-	
				R6.11.21				
				R7.2.28				
18	調布市立調布中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	21,923,000円	R6.11.20	三盛電設(株)	0%	-	
				R6.11.21				
				R7.3.7				
19	調布市立滝坂小学校特別教室ほか空調設備更新工事	空調設備の更新工事	10,681,000円	R6.11.26	東和空調(株)	0%	-	
				R6.11.27				
				R7.1.31				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
20	調布市国史跡 下布田遺跡整備工事(第1期)	土地造成等工事	72,600,000円	R6.9.6	共伸建設(株)	25%	10%	参考写真 No.6
				R6.9.9 ～ R7.3.14				
21	調布市郷土博 物館分室解体 工事	郷土博物館分室 解体工事	35,739,000円	R6.11.13	(株)ティーバ ランス	0%	-	
				R6.11.14 ～ R7.3.7				



No.1

調布市立八雲台小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事

外壁改修 施工状況



No.2

調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事


南側校舎外壁改修 施工状況



No.3

調布市立神代中学校校格技棟改修工事

内部改修 施工状況

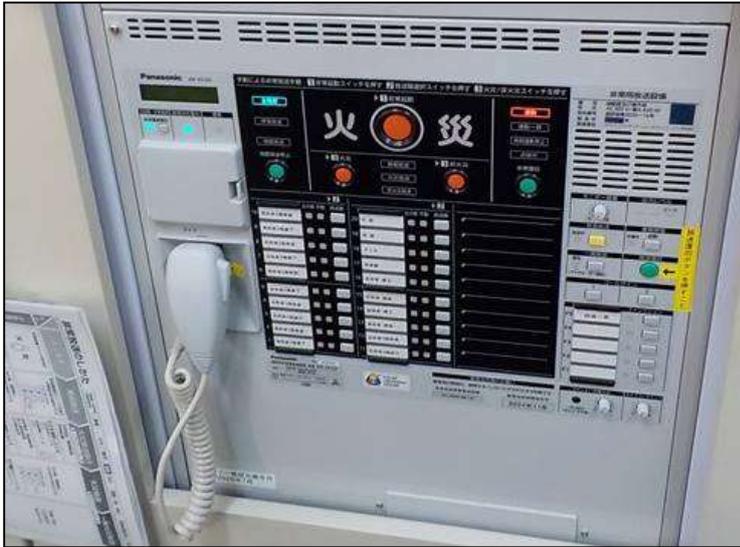

No.4
調布市立八雲台小学校防災盤改修工事
非常放送設備 更新完了



No.5
調布市立第四中学校校庭整備工事
中庭撤去 施工状況



No.6
調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第1期)
造成工事 施工状況
