

EKIHIRO

調布駅前広場

タイムズ

第7号 令和6年3月発行 調布市



令和6年度調布駅前広場の整備内容について(予定)

工事期間中は、ご迷惑をおかけいたしますが、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

令和6年度工事の主な流れ

調布駅前広場整備工事

- ① 区画道路2号の切り替え 令和6年夏頃
→信号機・横断歩道の移設や車線の増設等
- ② 南側ロータリーの切り替え 令和6年夏頃
→バス停の仮移設、既設ロータリーから新設ロータリーへの切り替え
- ③ 南側ロータリー供用(バス停本移設) 令和7年春頃
- ④ 広場東側側道一般車乗降場の整備 令和7年冬頃
→R7年度完成までは荷捌き車両対策のため工事用フェンスで閉鎖予定

調布駅前広場南側上屋工事

- ⑤ 南側ロータリー上屋完成 令和7年3月まで


調布駅広場口建替工事

- ⑥ 調布駅広場口 工事に向けて準備中

(仮称)調布駅前広場公衆トイレ新築工事


- ⑦ 工事期間 令和6年夏頃から令和7年3月まで(予定)
※工事期間、既存の公衆トイレは使用できます

■ 施工ステップ図(予定)

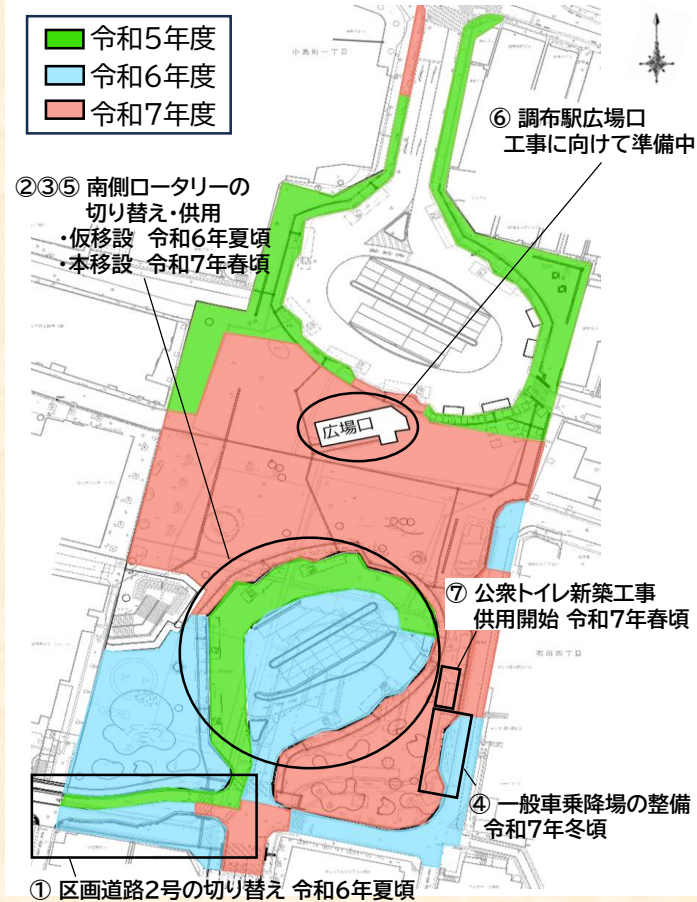


調布駅前広場南側上屋工事について

南側ロータリーの整備と併せて、バス乗降場、タクシー乗車場及び障害者用乗降場の上屋を設置します。
※工事は仮囲い等を移動しながら実施します。歩行動線は、工事の進捗により変更となる場合があります。

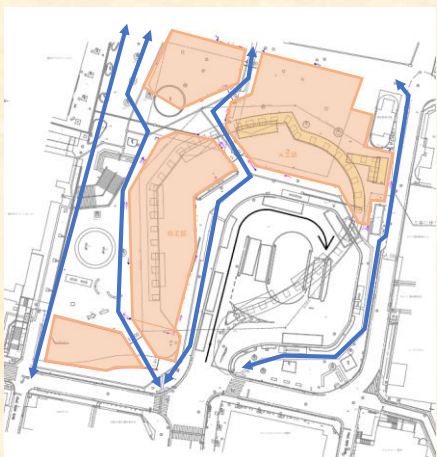


① 令和6年1月～5月頃

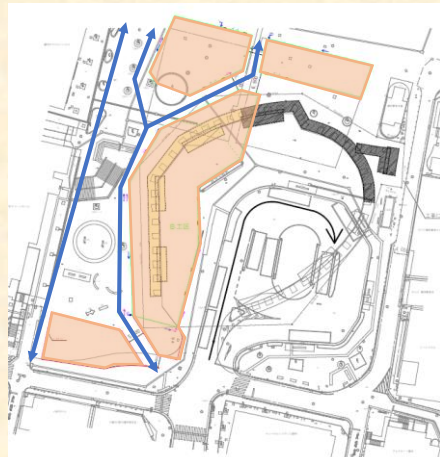

② 令和6年6月～8月頃



③ 令和6年9月～令和7年3月頃
※仮乗降車場については、バス事業者と調整中





調布駅前広場の整備状況について

令和7年度末の調布駅前広場完成(一部を除く)に向け、以下のとおり整備を進めています。

調布駅前広場整備工事

整備状況

- ・ 広場北側の歩行空間にベンチを設置しました
- ・ 広場北側の歩行空間を整備しました
- ・ 南側ロータリーの整備を進めています

工 期 令和8年3月まで



▲ベンチの設置



▲歩行空間の整備

調布駅前広場南側上屋工事

整備状況

- ・ 仮囲いを設置し、南側ロータリー上屋を設置するための掘削工事を行っています

工 期 令和7年3月まで



▲掘削工事の状況

調布駅前広場の完成後のイメージをVR（バーチャルリアリティ）で作成し、YouTubeで公開しています。ぜひご覧ください。

アクセスはこちらから▶



駅前広場の自転車通行制限について

仮囲いの設置に伴い、歩行者の安全確保のため、広場内の自転車通行制限を実施しています。

自転車利用者の皆様は迂回のご協力をお願いします。



▲通行制限用のバリケードを設置



【お問合せ先】

調布市 都市整備部
街づくり事業課
〒182-8511
東京都調布市小島町2-35-1
☎:042-481-7417
✉: seibi@city.chofu.lg.jp

登録番号
(刊行物番号)

2023-180
