

令和4年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和5年1月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日		受注者	進捗率		備考
				工	期		今回	前回	
1	調布市立第一小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	148,500,000円	R4.5.31	R4.6.1 ～ R4.12.15	(株)ライフスタイル	100%	95%	12月22日 完了検査 参考写真 No.1 *1
				R4.6.1 ～ R4.12.15					
2	調布市立第一小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	44,957,000円	R4.5.31	R4.6.1 ～ R4.12.15	深電工業(株)	100%	95%	12月22日 完了検査
				R4.6.1 ～ R4.12.15					
3	調布市立第一小学校体育館改修に伴う機械設備工事	体育館改修に伴う機械設備工事	12,320,000円	R4.5.31	R4.6.1 ～ R4.12.15	平井設備(株)	100%	95%	12月22日 完了検査
				R4.6.1 ～ R4.12.15					
4	調布市立国領小学校給食室ほか改修工事	給食室改修工事	96,470,000円	R4.6.13	R4.6.14 ～ R5.2.28	(株)貴建築工房	80%	70%	参考写真 No.2
				R4.6.14 ～ R5.2.28					
5	調布市立国領小学校給食室ほか改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	37,335,100円	R4.6.13	R4.6.14 ～ R5.2.28	(株)三誠	70%	60%	
				R4.6.14 ～ R5.2.28					
6	調布市立国領小学校給食室ほか改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	136,400,000円	R4.6.13	R4.6.14 ～ R5.2.28	宮沢設備工業(株)	35%	25%	
				R4.6.14 ～ R5.2.28					
7	調布市立上ノ原小学校体育館外部改修工事	体育館屋根及び外壁改修工事	63,250,000円	R4.6.15	R4.6.16 ～ R5.1.20	三栄フロンティア(株)	99%	95%	参考写真 No.3 *2
				R4.6.16 ～ R5.1.20					
8	調布市立多摩川小学校校舎増築工事	校舎増築工事	182,600,000円 (教育総務課分) 111,606,000円 児童青少年課分 70,994,000円)	R4.6.27	R4.6.28 ～ R5.3.17	林建設(株)	55%	35%	参考写真 No.4
				R4.6.28 ～ R5.3.17					
9	調布市立多摩川小学校校舎増築に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	34,012,000円 (教育総務課分) 22,682,000円 児童青少年課分 11,330,000円)	R4.6.27	R4.6.28 ～ R5.3.17	三盛電設(株)	30%	15%	
				R4.6.28 ～ R5.3.17					

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立多摩川小学校校舎増築に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	39,820,000円 (教育総務課分 23,323,300円 児童青少年課分 16,496,700円)	R4.6.27	(株)あかつき設備	37%	29%	
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
11	調布市立布田小学校校舎増築工事	校舎増築工事	236,500,000円 (教育総務課分 185,867,000円 児童青少年課分 50,633,000円)	R4.6.27	相互建設(株)	52%	44%	参考写真 No.5
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
12	調布市立布田小学校校舎増築に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	37,235,000円 (教育総務課分 28,790,300円 児童青少年課分 8,444,700円)	R4.6.27	いわき電工(株)本店	25%	20%	
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
13	調布市立布田小学校校舎増築に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	51,700,000円 (教育総務課分 40,084,000円 児童青少年課分 11,616,000円)	R4.6.27	宮沢設備工業(株)	25%	20%	
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
14	調布市立石原小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	25,374,800円	R4.7.29	園部電設(株)	0%	0%	
				R4.8.1 ～ R5.9.15				
15	調布市立第二小学校防災盤改修工事	防災盤の改修工事	6,932,200円	R4.8.25	深電工業(株)	0%	0%	
				R4.8.26 ～ R5.3.1				
16	調布市立第三小学校防災盤改修工事	防災盤の改修工事	10,087,000円	R4.8.25	(株)葉月商会	90%	0%	
				R4.8.26 ～ R5.3.1				
17	調布市立上ノ原小学校防災盤改修工事	防災盤の改修工事	9,911,000円	R4.8.25	小林電気(株)	0%	0%	
				R4.8.26 ～ R5.3.1				
18	調布市立調布中学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事	17,369,000円	R4.12.1	(株)二十二設備	50%	1%	
				R4.12.2 ～ R5.3.17				
19	調布市立石原小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事	17,160,000円	R4.12.8	平井設備(株)	3%	0%	
				R4.12.9 ～ R5.3.17				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
20	調布市八ヶ岳少年自然の家機械設備改修工事	給排水設備改修及び浄化槽更新工事	141, 163, 000 円	R4.6.14	(株)あかつき設備	30%	5%	参考写真 No.6
				R4.6.15				
				R5.3.17				
21	調布市八ヶ岳少年自然の家受変電設備改修工事	受変電設備改修工事	34, 848, 000 円	R4.7.29	(株)磯原電気	0%	0%	
				R4.8.1 ～ R5.12.1				
22	調布市立東部保育園・調布市立東部児童館・調布市東部公民館外壁及び屋上防水改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	54, 890, 000 円 (保育課分 21, 963, 700 円 児童青少年課分 17, 532, 900 円 東部公民館分 15, 393, 400 円)	R4.8.9	林建設(株)	61%	27%	参考写真 No.7
				R4.8.10 ～ R5.2.24				
23	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修工事	外壁・屋上防水及び内部改修工事	56, 760, 000 円 (協働推進課分 38, 306, 400 円 図書館分 18, 453, 600 円)	R4.8.10	(株)川又工務店	45%	30%	
				R4.8.12 ～ R5.3.17				
24	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修に伴う電気設備工事	地域福祉センター及び図書館改修に伴う電気設備工事	20, 317, 000 円 (協働推進課分 14, 500, 200 円 図書館分 5, 816, 800 円)	R4.8.10	多摩電設工業(株)	50%	30%	
				R4.8.12 ～ R5.3.17				
25	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修に伴う機械設備工事	地域福祉センター及び図書館改修に伴う機械設備工事	14, 377, 000 円 (協働推進課分 13, 560, 800 円 図書館分 816, 200 円)	R4.8.10	(株)あかつき設備	30%	25%	
				R4.8.12 ～ R5.3.17				
26	調布市武者小路実篤記念館外壁及び屋上防水等改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	29, 315, 000 円	R4.9.22	(株)田邊工務店	55%	15%	
				R4.9.26 ～ R5.3.10				
27	調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事	エレベーター設置工事	80, 300, 000 円	R4.11.7	林建設(株)	3%	1%	
				R4.11.8 ～ R5.12.22				
28	調布市八ヶ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事	空調設備改修工事	196, 460, 000 円	R4.12.21	大成温・宮越建設共同企業体	0%	—	
				R4.12.22 ～ R6.3.15				

注 記

*1 契約変更(R4.12.14 締結)

変更内容 : 契約額

(変更前) 148, 500, 000 円 ⇒ (変更後) 149, 699, 000 円

理由 : 内装材等の撤去作業を行ったところ、壁や一部の床で、設計時に想定していた状態と異なることが判明し、施工方法の変更等に伴う工事費の増が発生したため。

*2 契約変更(R4.12.16 締結)

変更内容 : 工期の延伸

(変更前) 令和4年12月16日 ⇒ (変更後) 令和5年1月20日

理由 : 天候不良等により工事の休工が発生し、当初予定していた工事期間内での完了が困難となったため。



No.1

調布市立第一小学校体育館改修工事

工事完了



No.2

調布市立国領小学校給食室ほか改修工事

調理室内 施工状況




No.3

調布市上ノ原小学校体育館外部改修工事


外壁改修 工事完了



No.4
調布市立多摩川小学校校舎増築工事
躯体工事 施工状況

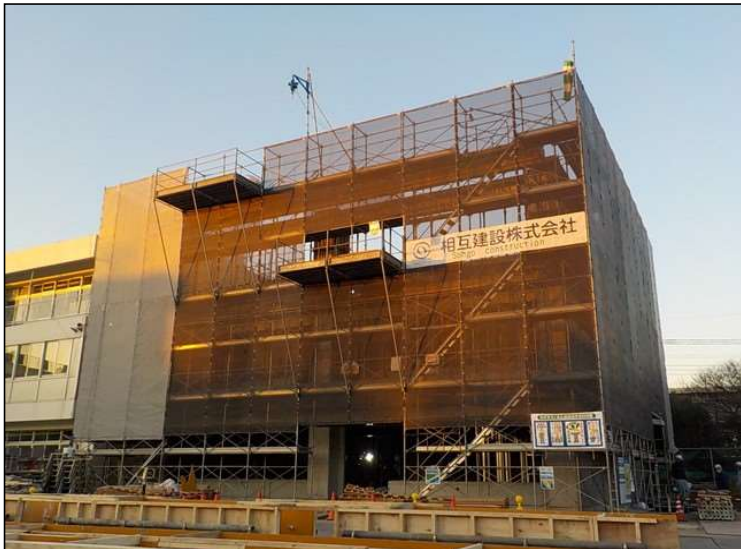

No.5
調布市立布田小学校校舎増築工事
3階躯体工事 施工状況

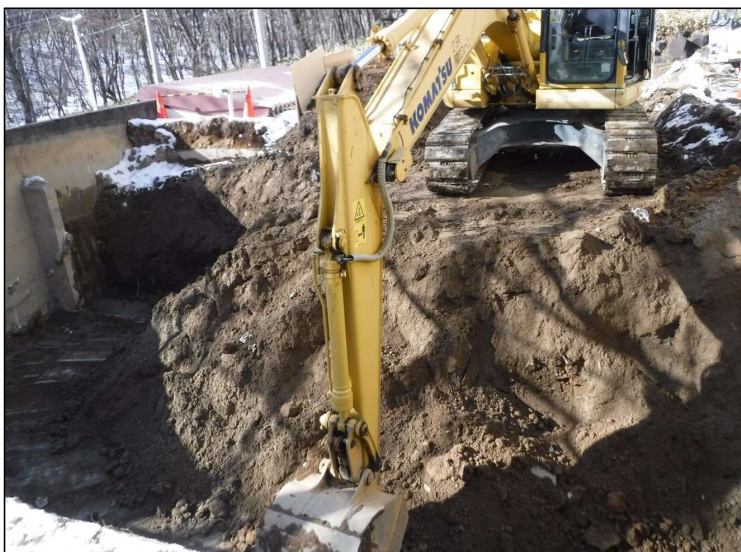

No.6
調布市八ヶ岳少年自然の家機械設備改修工事
浄化槽改修 施工状況



No.7

調布市立東部保育園・調布市立東部児童館・
調布市東部公民館外壁及び屋上防水改修工事

屋上防水 施工状況
