

令和4年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和4年8月8日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立第一小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	148,500,000円	R4.5.31	(株)ライフスタイル	7%	3%	参考写真No.1
				R4.6.1 ～ R4.12.15				
2	調布市立第一小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	44,957,000円	R4.5.31	深電工業(株)	15%	5%	
				R4.6.1 ～ R4.12.15				
3	調布市立第一小学校体育館改修に伴う機械設備工事	体育館改修に伴う機械設備工事	12,320,000円	R4.5.31	平井設備(株)	10%	5%	
				R4.6.1 ～ R4.12.15				
4	調布市立国領小学校給食室ほか改修工事	給食室改修工事	96,470,000円	R4.6.13	(株)貴建築工房	10%	2%	参考写真No.2
				R4.6.14 ～ R5.2.28				
5	調布市立国領小学校給食室ほか改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	37,335,100円	R4.6.13	(株)三誠	1%	0%	
				R4.6.14 ～ R5.2.28				
6	調布市立国領小学校給食室ほか改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	136,400,000円	R4.6.13	宮沢設備工業(株)	2%	0%	
				R4.6.14 ～ R5.2.28				
7	調布市立上ノ原小学校体育館外部改修工事	体育館屋根及び外壁改修工事	63,250,000円	R4.6.15	三栄フロンティア(株)	12%	3%	参考写真No.3
				R4.6.16 ～ R4.12.16				
8	調布市立北ノ台小学校北校舎外壁改修工事	校舎外壁改修工事	35,464,000円	R4.6.15	(株)田邊工務店	2%	1%	
				R4.6.16 ～ R4.10.31				
9	調布市立布田小学校小荷物専用昇降機更新工事	給食専用小荷物昇降機更新工事	8,388,468円	R4.6.23	万年エレベーター(株)	0%	0%	
				R4.6.24 ～ R4.8.29				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立多摩川小学校校舎増築工事	校舎増築工事	182,600,000円 (教育総務課分 111,606,000円 児童青少年課分 70,994,000円)	R4.6.27	林建設(株)	3%	0%	参考写真 No.4
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
11	調布市立多摩川小学校校舎増築に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	34,012,000円 (教育総務課分 22,682,000円 児童青少年課分 11,330,000円)	R4.6.27	三盛電設(株)	2%	0%	
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
12	調布市立多摩川小学校校舎増築に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	39,820,000円 (教育総務課分 23,323,300円 児童青少年課分 16,496,700円)	R4.6.27	(株)あかつき設備	1%	0%	
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
13	調布市立布田小学校校舎増築工事	校舎増築工事	236,500,000円 (教育総務課分 185,867,000円 児童青少年課分 50,633,000円)	R4.6.27	相互建設(株)	1%	0%	参考写真 No.5
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
14	調布市立布田小学校校舎増築に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	37,235,000円 (教育総務課分 28,790,300円 児童青少年課分 8,444,700円)	R4.6.27	いわき電工(株)本店	0%	0%	
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
15	調布市立布田小学校校舎増築に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	51,700,000円 (教育総務課分 40,084,000円 児童青少年課分 11,616,000円)	R4.6.27	宮沢設備工業(株)	0%	0%	
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
16	調布市立富士見台小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	27,720,000円	R4.7.7	正勝建設(株)	0%	0%	
				R4.7.8 ～ R4.11.30				
17	調布市立北ノ台小学校校庭整備工事	校庭整備工事	29,040,000円	R4.7.7	(株)鈴清土木	35%	0%	参考写真 No.6
				R4.7.8 ～ R4.9.30				
18	調布市立飛田給小学校校庭整備工事	校庭整備工事	34,320,000円	R4.7.14	(株)井上グラウンド施設工事	1%	-	
				R4.7.15 ～ R4.10.21				
19	調布市立石原小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	25,374,800円	R4.7.29	園部電設(株)	0%	-	
				R4.8.1 ～ R5.9.15				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
20	調布市立染地小学校多目的ホールほか空調整備工事	空調設備整備工事	19,250,000円	R4.7.29	木村設備株	0%	-	
				R4.8.1 ～				
				R4.10.31				
21	調布市西部公民館軒樋改修工事	軒樋改修工事	12,404,700円	R4.5.30	正勝建設株	100%	20%	完了検査 8月5日 *1
				R4.5.31 ～				
				R4.7.29				
22	調布市八ヶ岳少年自然の家機械設備改修工事	給排水設備改修及び浄化槽更新工事	141,163,000円	R4.6.14	株あかつき設備	0%	0%	
				R4.6.15 ～				
				R5.3.17				
23	調布市八ヶ岳少年自然の家受変電設備改修工事	受変電設備改修工事	34,848,000円	R4.7.29	株磯原電気	0%	-	
				R4.8.1 ～				
				R5.12.1				


注 記

*1 契約変更(R4.7.27 締結)

変更内容：契約額

(変更前) 10,318,000円 ⇒ (変更後) 12,404,700円

理由：外部足場を設置し、外壁等の補修箇所の詳細調査を行ったところ、補修箇所の数量が増加したことにより、施工費が増額したため。

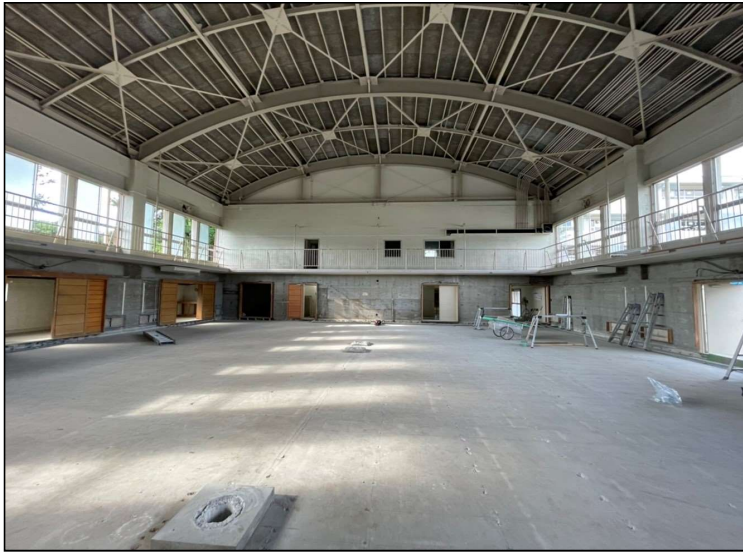

No.1
調布市立第一小学校体育館改修工事
体育館内部撤去 施工状況



No.2
調布市立国領小学校給食室ほか改修工事
調理室内部撤去 施工状況



No.3
調布市立上ノ原小学校体育館外部改修工事
仮設足場 設置状況



No.4
調布市立多摩川小学校校舎増築工事
仮囲い 設置状況



No.5
調布市立布田小学校校舎増築工事
仮囲い 設置状況



No.6
調布市立北ノ台小学校校庭整備工事
校庭 施工状況
