

令和4年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和4年12月9日現在


教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立第一小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	148,500,000円	R4.5.31	(株)ライフスタイル	95%	80%	
				R4.6.1 ～ R4.12.15				
2	調布市立第一小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	44,957,000円	R4.5.31	深電工業(株)	95%	80%	参考写真 No.1
				R4.6.1 ～ R4.12.15				
3	調布市立第一小学校体育館改修に伴う機械設備工事	体育館改修に伴う機械設備工事	12,320,000円	R4.5.31	平井設備(株)	95%	75%	
				R4.6.1 ～ R4.12.15				
4	調布市立国領小学校給食室ほか改修工事	給食室改修工事	96,470,000円	R4.6.13	(株)貴建築工房	70%	42%	参考写真 No.2
				R4.6.14 ～ R5.2.28				
5	調布市立国領小学校給食室ほか改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	37,335,100円	R4.6.13	(株)三誠	60%	20%	
				R4.6.14 ～ R5.2.28				
6	調布市立国領小学校給食室ほか改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	136,400,000円	R4.6.13	宮沢設備工業(株)	25%	15%	
				R4.6.14 ～ R5.2.28				
7	調布市立上ノ原小学校体育館外部改修工事	体育館屋根及び外壁改修工事	63,250,000円	R4.6.15	三栄フロンティア(株)	95%	84%	
				R4.6.16 ～ R5.12.16				
8	調布市立多摩川小学校校舎増築工事	校舎増築工事	182,600,000円 (教育総務課分 111,606,000円 児童青少年課分 70,994,000円)	R4.6.27	林建設(株)	35%	25%	参考写真 No.3
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
9	調布市立多摩川小学校校舎増築に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	34,012,000円 (教育総務課分 22,682,000円 児童青少年課分 11,330,000円)	R4.6.27	三盛電設(株)	15%	5%	
				R4.6.28 ～ R5.3.17				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立多摩川小学校校舎増築に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	39,820,000円 (教育総務課分 23,323,300円 児童青少年課分 16,496,700円)	R4.6.27	株あかつき設備	29%	16%	
				R4.6.28				
				～ R5.3.17				
11	調布市立布田小学校校舎増築工事	校舎増築工事	236,500,000円 (教育総務課分 185,867,000円 児童青少年課分 50,633,000円)	R4.6.27	相互建設株	44%	25%	参考写真 No.4
				R4.6.28				
				～ R5.3.17				
12	調布市立布田小学校校舎増築に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	37,235,000円 (教育総務課分 28,790,300円 児童青少年課分 8,444,700円)	R4.6.27	いわき電工 (株)本店	20%	15%	
				R4.6.28				
				～ R5.3.17				
13	調布市立布田小学校校舎増築に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	51,700,000円 (教育総務課分 40,084,000円 児童青少年課分 11,616,000円)	R4.6.27	宮沢設備工業株	20%	12%	
				R4.6.28				
				～ R5.3.17				
14	調布市立富士見台小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	27,720,000円	R4.7.7	正勝建設株	100%	72%	12月13日完了検査 予定 参考写真 No.5
				R4.7.8				
				～ R4.11.30				
15	調布市立石原小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	25,374,800円	R4.7.29	園部電設株	0%	0%	
				R4.8.1				
				～ R5.9.15				
16	調布市立第二小学校防災盤改修工事	防災盤の改修工事	6,932,200円	R4.8.25	深電工業株	0%	0%	
				R4.8.26				
				～ R5.3.1				
17	調布市立第三小学校防災盤改修工事	防災盤の改修工事	10,087,000円	R4.8.25	株葉月商会	0%	0%	
				R4.8.26				
				～ R5.3.1				
18	調布市立上ノ原小学校防災盤改修工事	防災盤の改修工事	9,911,000円	R4.8.25	小林電気株	0%	0%	
				R4.8.26				
				～ R5.3.1				
19	調布市立調布中学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (第六中)	17,369,000円	R4.12.1	株二十二設備	1%	-	
				R4.12.2				
				～ R5.3.17				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
20	調布市立石原小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事(第一小)	17,160,000円	R4.12.8	平井設備(株)	0%	-	
				R4.12.9				
				R5.3.17				
21	調布市八ヶ岳少年自然の家機械設備改修工事	給排水設備改修及び浄化槽更新工事	141,163,000円	R4.6.14	(株)あかつき設備	5%	0%	
				R4.6.15				
				R5.3.17				
22	調布市八ヶ岳少年自然の家受変電設備改修工事	受変電設備改修工事	34,848,000円	R4.7.29	(株)磯原電気	0%	0%	
				R4.8.1				
				R5.12.1				
23	調布市立東部保育園・調布市立東部児童館・調布市東部公民館外壁及び屋上防水改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	54,890,000円(保育課分) 21,963,700円 児童青少年課分 17,532,900円 東部公民館分 15,393,400円)	R4.8.9	林建設(株)	27%	15%	
				R4.8.10				
				R5.2.24				
24	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修工事	外壁・屋上防水及び内部改修工事	56,760,000円(協働推進課分) 38,306,400円 図書館分 18,453,600円)	R4.8.10	(株)川又工務店	30%	15%	参考写真No.6
				R4.8.12				
				R5.3.17				
25	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修に伴う電気設備工事	地域福祉センター及び図書館改修に伴う電気設備工事	20,317,000円(協働推進課分) 14,500,200円 図書館分 5,816,800円)	R4.8.10	多摩電設工業(株)	30%	20%	
				R4.8.12				
				R5.3.17				
26	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修に伴う機械設備工事	地域福祉センター及び図書館改修に伴う機械設備工事	14,377,000円(協働推進課分) 13,560,800円 図書館分 816,200円)	R4.8.10	(株)あかつき設備	25%	20%	
				R4.8.12				
				R5.3.17				
27	調布市武者小路実篤記念館外壁及び屋上防水等改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	29,315,000円	R4.9.22	(株)田邊工務店	15%	3%	
				R4.9.26				
				R5.3.10				


No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
28	調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事	エレベーター設置工事	80,300,000円	R4.11.7	林建設株	1%	0%	
				R4.11.8 ～ R5.12.22				

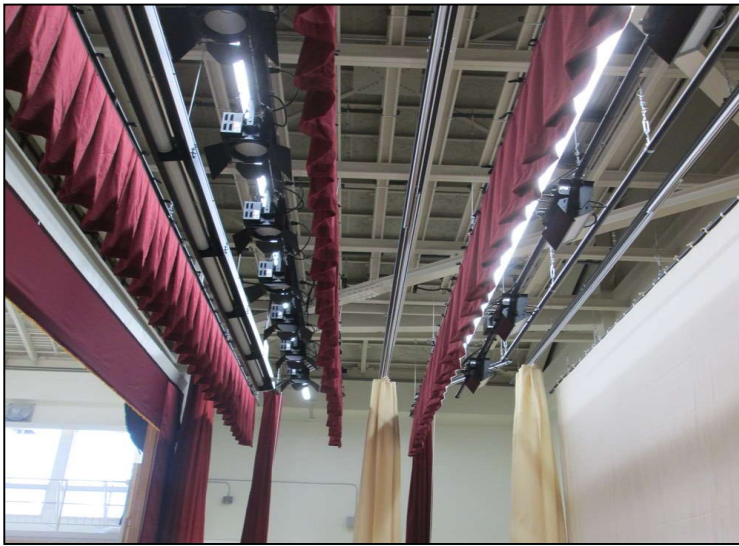

No.1
調布市立第一小学校体育館改修工事
舞台照明 施工状況



No.2
調布市立国領小学校給食室ほか改修工事
調理室内 施工状況

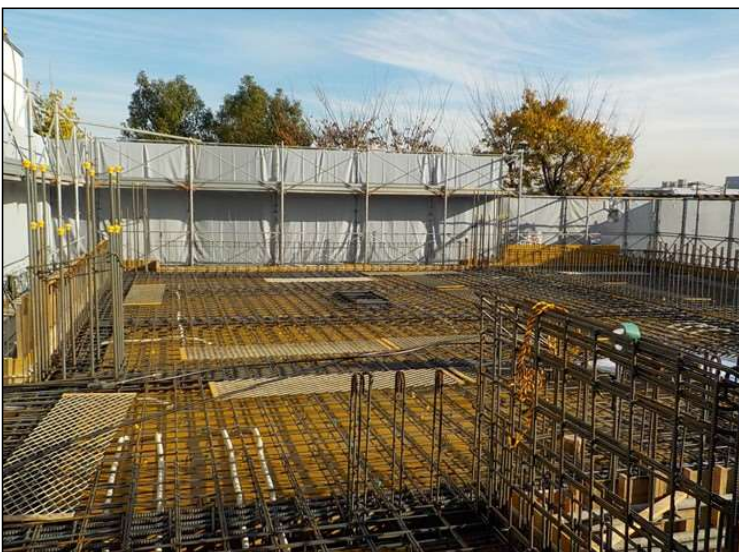


No.3
調布市立多摩川小学校校舎増築工事
2階躯体工事 施工状況



No.4
調布市立布田小学校校舎増築工事
1階躯体工事 施工状況



No.5
調布市立富士見台小学校普通教室整備工事
工事完了

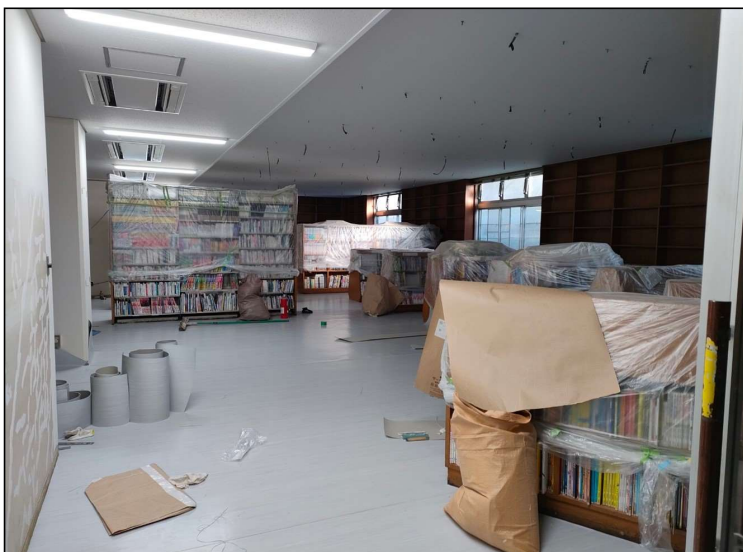

No.6
調布市染地地域福祉センター及び
調布市立図書館染地分館改修工事
内装 施工状況
