

令和2年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

資料 2

令和3年1月8日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立第七中学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	24,997,500円	R2.6.4	宮沢設備工業(株)	100%	99%	12月11日完了検査
				R2.6.5				
				R2.11.30				
2	調布市立第七中学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	146,047,000円	R2.6.4	(株)川又工務店	100%	99%	12月11日完了検査 *1
				R2.6.5				
				R2.12.11				
3	調布市立第七中学校体育館改修に伴う設備工事	体育館改修に伴う電気及び機械設備工事	42,438,000円	R2.6.4	園部電設(株)	100%	99%	12月11日完了検査
				R2.6.5				
				R2.12.11				
4	調布市立調和小学校中央監視装置改修工事	中央監視装置改修工事	39,820,000円	R2.6.8	小林電気(株)	100%	90%	参考写真 No.1 12月21日完了検査
				R2.6.9				
				R2.12.15				
5	調布市立北ノ台小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	132,000,000円	R2.6.12	相互建設(株)	100%	90%	12月24日完了検査
				R2.6.15				
				R2.12.18				
6	調布市立北ノ台小学校体育館改修に伴う設備工事	体育館改修に伴う電気及び機械設備工事	46,860,000円	R2.6.12	(株)大東電設	100%	95%	12月24日完了検査
				R2.6.15				
				R2.12.18				
7	調布市立布田小学校体育館内部改修工事	体育館内部改修工事	97,350,000円	R2.6.15	林建設(株)	100%	99%	参考写真 No.2・3 12月23日完了検査
				R2.6.16				
				R2.12.15				
8	調布市立布田小学校体育館内部改修に伴う設備工事	体育館改修に伴う電気及び機械設備工事	53,493,000円	R2.6.15	三盛電設(株)	100%	95%	12月23日完了検査
				R2.6.16				
				R2.12.15				
9	調布市立調和小学校給食用給湯設備改修工事	給食用給湯設備改修工事	5,368,000円	R2.11.6	平井設備(株)	80%	5%	参考写真 No.4
				R2.11.9				
				R3.1.29				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立上ノ原小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (柏野小)	23,485,000円	R2.12.17	東和空調(株)	0%	-	
				R2.12.18 ～				
				R3.3.18				
11	調布市立若葉小学校校舎ガラス改修工事	校舎ガラス改修工事	11,935,000円	R2.12.17	(株)田邊工務店	80%	-	
				R2.12.18 ～				
				R3.2.19				
12	調布市立第二小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (第四中)	13,970,000円	R2.12.22	木村設備(株)	0%	-	
				R2.12.23 ～				
				R3.3.18				
13	調布市立若葉小学校プール循環浄化装置更新工事	プール循環浄化装置更新工事	9,889,000円	R2.12.25	宮越設備工業(株)	0%	-	
				R2.12.28 ～				
				R3.3.18				
14	調布市立第三小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (多摩川小)	17,710,000円	R2.12.25	(株)あかつき設備	0%	-	
				R2.12.28 ～				
				R3.3.18				
15	調布市立第五保育園・調布市立図書館国領分館外壁及び屋上防水ほか改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	31,130,000円 (図書館分 11,894,300円 保育課分 19,235,700円)	R2.7.15	三栄フロンティア(株)	100%	99%	12月11日 完了検査
				R2.7.16 ～				
				R2.11.30				
16	調布市武者小路実篤記念館エレベーター改修工事	エレベーター改修工事	17,689,320円	R2.7.22	横浜エレベーター(株)	70%	2%	参考写真 No.5
				R2.7.27 ～				
				R3.3.5				
17	調布市北部公民館電気設備改修工事	電気設備改修工事	15,928,000円	R2.8.19	(株)葉月商会	50%	30%	
				R2.8.20 ～				
				R3.2.19				
18	調布市立図書館宮の下分館集会室外壁改修工事	外壁改修工事	1,760,000円	R2.10.15	(株)ビルディングドクター	100%	65%	参考写真 No.6 12月25日 完了検査
				R2.10.16 ～				
				R2.12.25				

注記

*1 契約変更

変更内容：契約額

(変更前) 145,200,000円 ⇒ (変更後) 146,047,000円


理由：施工方法等の仕様変更による施工費の増。



No.1
調布市立北ノ台小学校体育館改修工事
体育館内部 施工完了



No.2
調布市立布田小学校体育館内部改修工事
女子トイレ 施工完了

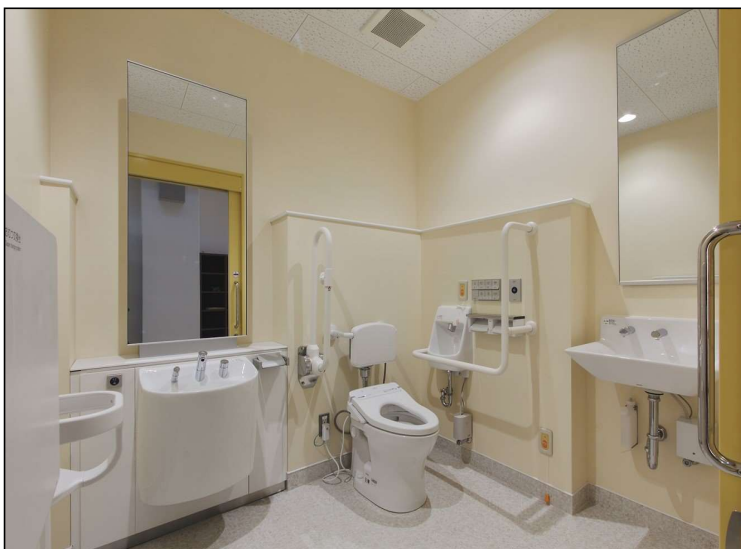


No.3
調布市立布田小学校体育館内部改修工事
だれでもトイレ 施工完了



No.4

調布市立調和小学校給食用給湯設備改修工事

給湯器設置 施工状況

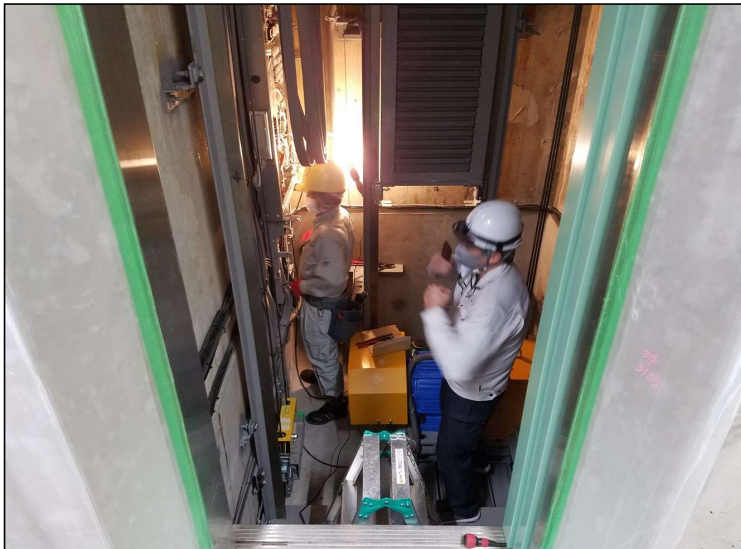

No.5

調布市武者小路実篤記念館エレベーター改修工事

エレベーターシャフト内 施工状況



No.6

調布市立図書館宮の下分館集会所外壁改修工事

外壁 施工完了
