

令和3年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和3年9月10日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立柏野 小学校体育館 空調整備工事	体育館空調整備 工事	32,010,000円	R3.5.17	宮沢設備工 業(株)	100%	85%	8月31日 完了検査
				R3.5.18 ～ R3.8.23				
2	調布市立飛田 給小学校体育 館屋根及び外 壁改修工事	体育館屋根及び 外壁改修工事	44,990,000円	R3.6.1	(株)東京建設 コンサルタ ント	80%	20%	参考写真 No.1
				R3.6.2 ～ R3.9.30				
3	調布市立飛田 給小学校体育 館空調整備工 事	体育館空調整備 工事	26,400,000円	R3.6.1	(有)薩南温調	65%	10%	
				R3.6.2 ～ R3.9.30				
4	調布市立布田 小学校校舎外 壁改修工事	校舎外壁改修工 事	127,600,000円	R3.6.2	相互建設(株)	15%	5%	参考写真 No.2
				R3.6.3 ～ R4.1.31				
5	調布市立国領 小学校体育館 改修工事	体育館屋根・外壁 及び内部改修工 事	144,100,000円	R3.6.7	林建設(株)	41%	24%	
				R3.6.8 ～ R3.12.17				
6	調布市立国領 小学校体育館 改修に伴う電 気設備工事	体育館改修に伴う 電気設備工事	28,919,000円	R3.6.7	園部電設(株)	20%	5%	
				R3.6.8 ～ R3.12.17				
7	調布市立国領 小学校体育館 空調整備工事	体育館空調整備 工事	34,430,000円	R3.6.9	宮沢設備工 業(株)	5%	2%	
				R3.6.10 ～ R3.12.17				
8	調布市立八雲 台小学校体育 館空調整備工 事	体育館空調整備 工事	29,645,000円	R3.6.9	東和空調(株)	90%	30%	9月29日 完了検査 予定 参考写真 No.3
				R3.6.10 ～ R3.9.16				
9	調布市立富士 見台小学校体 育館改修工事	体育館屋根・外壁 及び内部改修工 事	116,380,000円	R3.6.11	(株)川又工務 店	22%	15%	参考写真 No.4
				R3.6.14 ～ R3.12.28				


No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立富士見台小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	33,231,000円	R3.6.11	三盛電設(株)	18%	8%	
				R3.6.14 ～ R3.12.28				
11	調布市立富士見台小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	29,590,000円	R3.6.11	(株)あかつき設備	5%	0%	
				R3.6.14 ～ R3.12.28				
12	調布市立第二小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	24,970,000円	R3.6.17	木村設備(株)	95%	15%	9月24日完了検査予定
				R3.6.18 ～ R3.9.24				
13	調布市立柏野小学校給食室改修工事	給食室改修工事	148,665,000円	R3.7.6	相互建設(株)	10%	1%	参考写真No.5
				R3.7.7 ～ R4.2.4				
14	調布市立柏野小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	36,731,200円	R3.7.6	深電工業(株)	3%	2%	
				R3.7.7 ～ R4.2.4				
15	調布市立柏野小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	130,790,000円	R3.7.6	宮沢設備工業(株)	5%	2%	
				R3.7.7 ～ R4.2.4				
16	調布市立若葉小学校体育館屋根ほか改修工事	体育館屋根などの改修工事	18,623,000円	R3.7.8	(株)田邊工務店	99%	35%	9月22日完了検査予定
				R3.7.9 ～ R3.9.30				
17	調布市立石原小学校校庭整備工事	校庭整備工事	26,675,000円	R3.7.15	(株)鈴清土木	85%	0%	参考写真No.6
				R3.7.16 ～ R3.9.30				
18	調布市立滝坂小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	22,990,000円	R3.7.20	三栄フロンティア(株)	75%	5%	
				R3.7.21 ～ R3.9.30				



No.1
調布市立飛田給小学校体育館
屋根及び外壁改修工事
外壁改修 施工状況



No.2
調布市立布田小学校校舎外壁改修工事
仮設足場 設置状況

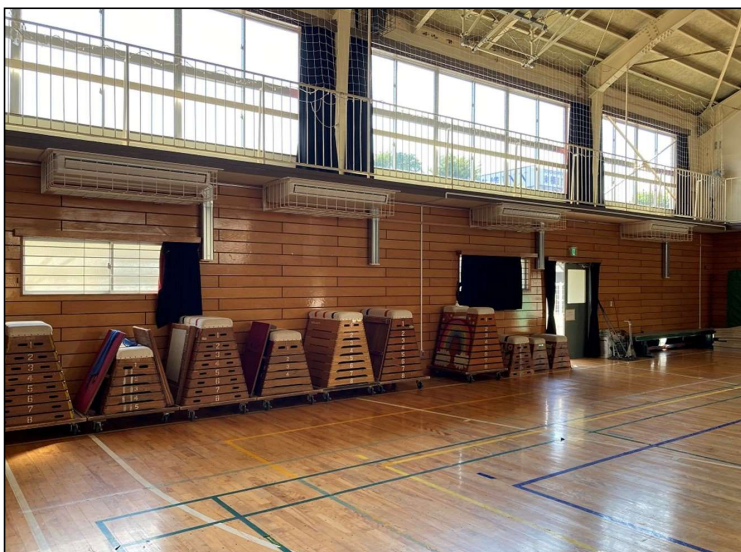

No.3
調布市立八雲台小学校体育館空調整備工事
空調室内機 設置状況



No.4
調布市立富士見台小学校体育館改修工事
屋根塗装工事 施工完了



No.5
調布市立柏野小学校給食室改修工事
解体作業 施工状況



No.6
調布市立石原小学校校庭整備工事
校庭 施工状況
