


令和5年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和5年6月9日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立石原小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	25,374,800円	R4.7.29	園部電設(株)	0%	0%	
				R4.8.1				
				～ R5.9.15				
2	調布市立富士見台小学校防災盤ほか改修工事	防災盤等更新工事	9,515,000円	R5.4.26	三盛電設(株)	1%	0%	
				R5.4.27				
				～ R5.9.29				
3	調布市立石原小学校防災盤ほか改修工事	防災盤等更新工事	9,179,500円	R5.4.26	深電工業(株)	0%	0%	
				R5.4.27				
				～ R5.9.29				
4	調布市八ヶ岳少年自然の家受変電設備改修工事	受変電設備改修工事	34,848,000円	R4.7.29	(株)磯原電気	0%	0%	
				R4.8.1				
				～ R5.12.1				
5	調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事	エレベーター設置工事	80,300,000円	R4.11.7	林建設(株)	36%	17%	参考写真 No.1
				R4.11.8				
				～ R5.12.22				
6	調布市八ヶ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事	空調設備改修工事	196,460,000円	R4.12.21	大成温・宮越建設共同企業体	0%	0%	
				R4.12.22				
				～ R6.3.15				
7	調布市佐須ふれあいの家・調布市立佐須児童館・調布市立図書館佐須分館外壁及び屋上防水改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	55,880,000円 (図書館分 25,401,200円 児童青少年課分 25,201,000円 協働推進課分 5,277,800円)	R5.4.19	三栄フロンティア(株)	10%	3%	参考写真 No.2
				R5.4.20				
				～ R5.10.13				
8	調布市北部公民館外壁改修工事	外壁改修工事	18,040,000円	R5.5.10	(株)ビルディングドクター	15%	0%	参考写真 No.3
				R5.5.11				
				～ R5.9.8				
9	調布市八ヶ岳少年自然の家体育館外部改修工事	体育館外部改修工事	49,280,000円	R5.5.17	(株)久保工務店	0%	-	
				R5.5.18				
				～ R5.11.30				

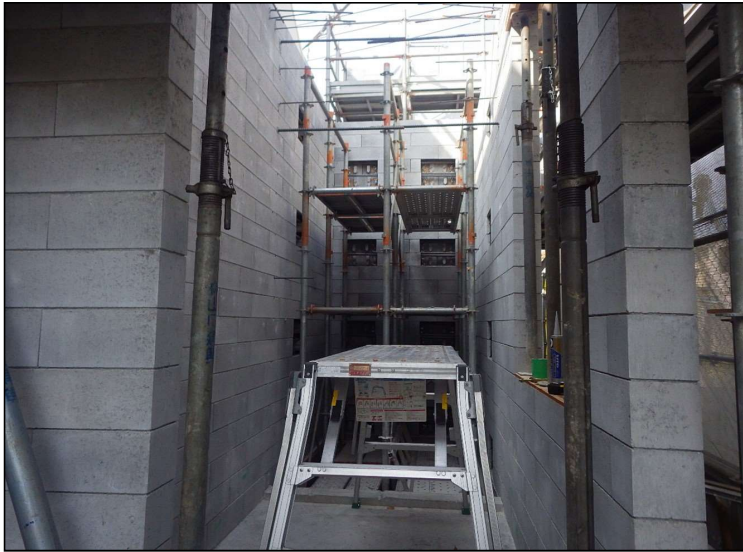

No.1

調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事

躯体工事 施工状況



No.2

調布市佐須ふれあいの家・調布市立佐須児童館・
調布市立図書館佐須分館外壁及び屋上防水改修工事

仮設工事 施工状況



No.3

調布市立北部公民館外壁改修工事

仮設工事 施工状況
