

令和5年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和5年7月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立石原小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	25,374,800円	R4.7.29	園部電設(株)	0%	0%	
				R4.8.1				
				R5.9.15				
2	調布市立富士見台小学校防災盤ほか改修工事	防災盤等更新工事	9,515,000円	R5.4.26	三盛電設(株)	5%	1%	
				R5.4.27				
				R5.9.29				
3	調布市立石原小学校防災盤ほか改修工事	防災盤等更新工事	9,179,500円	R5.4.26	深電工業(株)	0%	0%	
				R5.4.27				
				R5.9.29				
4	調布市立深大寺小学校給食室改修工事	給食室改修工事	121,000,000円	R5.6.22	林建設(株)	0%	-	
				R5.6.23				
				R6.3.22				
5	調布市立深大寺小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	30,250,000円	R5.6.22	(株)大東電設	0%	-	
				R5.6.23				
				R6.3.22				
6	調布市立深大寺小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	146,850,000円	R5.6.22	宮沢設備工業(株)	0%	-	
				R5.6.23				
				R6.3.22				
7	調布市立神代中学校体育館外部改修工事	体育館外部改修工事	76,613,900円	R5.6.27	(株)川又工務店	2%	-	
				R5.6.28				
				R5.12.15				
8	調布市立国領小学校校庭整備工事	校庭整備工事	31,394,264円	R5.6.29	(株)井上グラウンド施設工事	0%	-	
				R5.6.30				
				R5.9.29				
9	調布市立第二小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	13,009,700円	R5.6.29	(株)三誠	0%	-	
				R5.6.30				
				R5.10.27				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立第三中学校第一体育館改修工事	体育館外部及び内部改修工事	194,700,000円	R5.7.5	林建設(株)	0%	-	
				R5.7.6				
				R6.2.16				
11	調布市立第三中学校第一体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	47,294,500円	R5.7.5	いわき電工(株)本店	0%	-	
				R5.7.6				
				R6.2.16				
12	調布市立石原小学校給食室改修工事	給食室改修工事	149,050,000円	R5.7.5	相互建設(株)	0%	-	
				R5.7.6				
				R6.3.22				
13	調布市立石原小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	33,715,000円	R5.7.5	深電工業(株)	0%	-	
				R5.7.6				
				R6.3.22				
14	調布市立石原小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	180,763,000円	R5.7.5	宮沢設備工業(株)	0%	-	
				R5.7.6				
				R6.3.22				
15	調布市八ヶ岳少年自然の家受変電設備改修工事	受変電設備改修工事	34,848,000円	R4.7.29	(株)磯原電気	0%	0%	
				R4.8.1				
				R5.12.1				
16	調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事	エレベーター設置工事	80,300,000円	R4.11.7	林建設(株)	45%	36%	参考写真No.1・2
				R4.11.8				
				R5.12.22				
17	調布市八ヶ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事	空調設備改修工事	196,460,000円	R4.12.21	大成温・宮越建設共同企業体	0%	0%	
				R4.12.22				
				R6.3.15				
18	調布市佐須ふれあいの家・調布市立佐須児童館・調布市立図書館佐須分館外壁及び屋上防水改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	55,880,000円 (図書館分 25,401,200円 児童青少年課分 25,201,000円 協働推進課分 5,277,800円)	R5.4.19	三栄フロンティア(株)	30%	10%	参考写真No.3
				R5.4.20				
				R5.10.13				
19	調布市北部公民館外壁改修工事	外壁改修工事	18,040,000円	R5.5.10	(株)ビルディングドクター	70%	15%	
				R5.5.11				
				R5.9.8				


No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
20	調布市八ヶ岳少年自然の家 体育館外部改修工事	体育館外部改修工事	49,280,000円	R5.5.17	(株)久保工務店	5%	0%	参考写真 No.4
				R5.5.18 ～ R5.11.30				
21	調布市立神代保育園及び調布市立図書館神代分館外壁改修工事	外壁改修工事	24,838,000円 (図書館分 8,998,000円 保育課分 15,840,000円)	R5.7.6	(株)田邊工務店	0%	-	
				R5.7.7 ～ R5.10.20				



No.1

調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事


躯体工事 施工状況

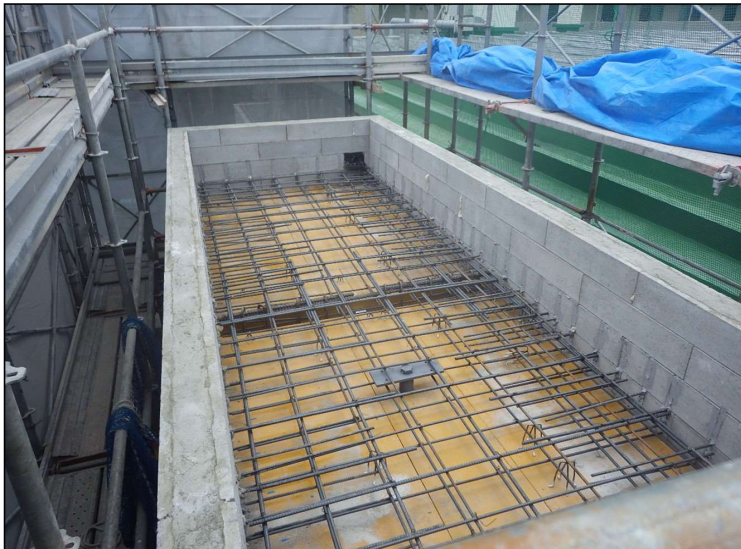

No.2

調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事

躯体工事 施工状況

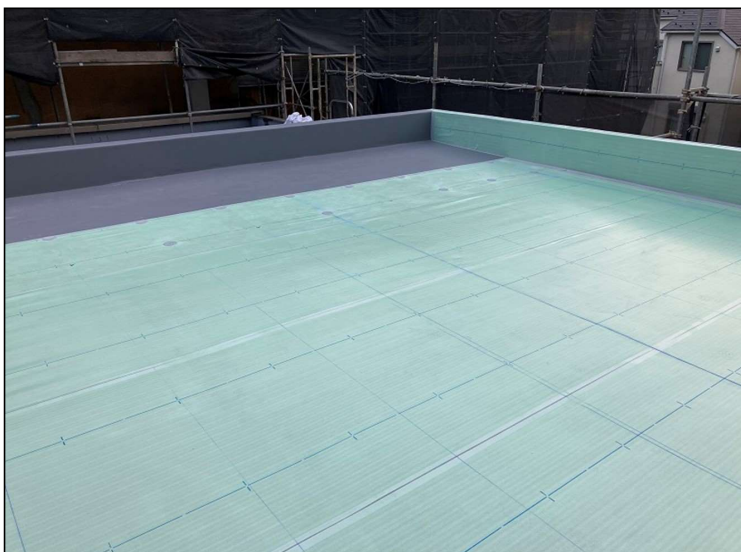

No.3

調布市佐須ふれあいの家・調布市立佐須児童館・
調布市立図書館佐須分館外壁及び屋上防水改修工事

屋上防水工事 施工状況



No.4

調布市八ヶ岳少年自然の家体育館外部改修工事

仮設工事 施工状況
