

## 令和5年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和5年9月8日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日		受注者	進捗率		備考
				工	期		今回	前回	
1	調布市立石原小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	25,374,800円	R4.7.29	R4.8.1 ～ R5.9.15	園部電設(株)	95%	20%	完了検査 9月26日 予定参考 写真 No.1
2	調布市立富士見台小学校防災盤ほか改修工事	防災盤等更新工事	9,515,000円	R5.4.26	R5.4.27 ～ R5.9.29	三盛電設(株)	95%	10%	
3	調布市立石原小学校防災盤ほか改修工事	防災盤等更新工事	9,179,500円	R5.4.26	R5.4.27 ～ R5.9.29	深電工業(株)	0%	0%	
4	調布市立深大寺小学校給食室改修工事	給食室改修工事	121,000,000円	R5.6.22	R5.6.23 ～ R6.3.22	林建設(株)	17%	1%	
5	調布市立深大寺小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	30,250,000円	R5.6.22	R5.6.23 ～ R6.3.22	(株)大東電設	18%	7%	
6	調布市立深大寺小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	146,850,000円	R5.6.22	R5.6.23 ～ R6.3.22	宮沢設備工業(株)	15%	5%	
7	調布市立神代中学校体育館外部改修工事	体育館外部改修工事	76,613,900円	R5.6.27	R5.6.28 ～ R5.12.15	(株)川又工務店	18%	7%	
8	調布市立国領小学校校庭整備工事	校庭整備工事	31,394,264円	R5.6.29	R5.6.30 ～ R5.9.29	(株)井上グラウンド施設工事	70%	50%	参考写真 No.2
9	調布市立第二小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	13,009,700円	R5.6.29	R5.6.30 ～ R5.10.27	(株)三誠	99%	20%	参考写真 No.3

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立第三中学校第一体育館改修工事	体育館外部及び内部改修工事	194,700,000円	R5.7.5	林建設(株)	18%	4%	参考写真No.4
				R5.7.6				
				R6.2.16				
11	調布市立第三中学校第一体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	47,294,500円	R5.7.5	いわき電工(株)本店	4%	1%	
				R5.7.6				
				R6.2.16				
12	調布市立石原小学校給食室改修工事	給食室改修工事	149,050,000円	R5.7.5	相互建設(株)	10%	5%	参考写真No.5
				R5.7.6				
				R6.3.22				
13	調布市立石原小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	33,715,000円	R5.7.5	深電工業(株)	10%	2%	
				R5.7.6				
				R6.3.22				
14	調布市立石原小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	180,763,000円	R5.7.5	宮沢設備工業(株)	10%	5%	
				R5.7.6				
				R6.3.22				
15	調布市立調和小学校校舎LED化改修工事(その1)	校舎LED化改修工事	17,919,000円	R5.7.13	園部電設(株)	95%	10%	
				R5.7.14				
				R5.9.29				
16	調布市立多摩川小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	23,925,000円	R5.7.13	(株)東京建設コンサルタント	20%	0%	参考写真No.6
				R5.7.14				
				R5.12.8				
17	調布市立第五中学校多目的室空調整備工事	空調設備整備工事	11,330,000円	R5.7.26	(株)二十二設備	90%	5%	完了検査9月27日予定 参考写真No.7
				R5.7.27				
				R5.9.15				
18	調布市八ヶ岳少年自然の家受変電設備改修工事	受変電設備改修工事	34,848,000円	R4.7.29	(株)磯原電気	4%	4%	参考写真No.8
				R4.8.1				
				R5.12.1				
19	調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事	エレベーター設置工事	80,300,000円	R4.11.7	林建設(株)	68%	57%	参考写真No.9
				R4.11.8				
				R5.12.22				
20	調布市八ヶ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事	空調設備改修工事	196,460,000円	R4.12.21	大成温・宮越建設共同企業体	0%	0%	
				R4.12.22				
				R6.3.15				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
21	調布市佐須ふれあいの家・調布市立佐須児童館・調布市立図書館佐須分館外壁及び屋上防水改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	55,880,000円 (図書館分 25,401,200円 児童青少年課分 25,201,000円 協働推進課分 5,277,800円)	R5.4.19	三栄フロンティア(株)	85%	60%	参考写真 No.10
				R5.4.20 ～ R5.10.13				
22	調布市北部公民館外壁改修工事	外壁改修工事	18,040,000円	R5.5.10	(株)ビルディングドクター	100%	80%	完了検査 9月8日 参考写真 No.11
				R5.5.11 ～ R5.9.8				
23	調布市八ヶ岳少年自然の家体育館外部改修工事	体育館外部改修工事	49,280,000円	R5.5.17	(株)久保工務店	65%	35%	参考写真 No.12
				R5.5.18 ～ R5.11.30				
24	調布市立神代保育園及び調布市立図書館神代分館外壁改修工事	外壁改修工事	24,838,000円 (図書館分 8,998,000円 保育課分 15,840,000円)	R5.7.6	(株)田邊工務店	70%	20%	
				R5.7.7 ～ R5.10.20				



No.1  
調布市立石原小学校受変電設備改修工事  
受変電設備 設置状況



No.2  
調布市立国領小学校校庭整備工事  
校庭 施工状況




No.3  
調布市立第二小学校校舎LED化改修工事  
LED照明 設置状況



No.4  
調布市立第三中学校第一体育館改修工事  
体育館内部 施工状況



No.5  
調布市立石原小学校給食室改修工事  
内部 解体状況

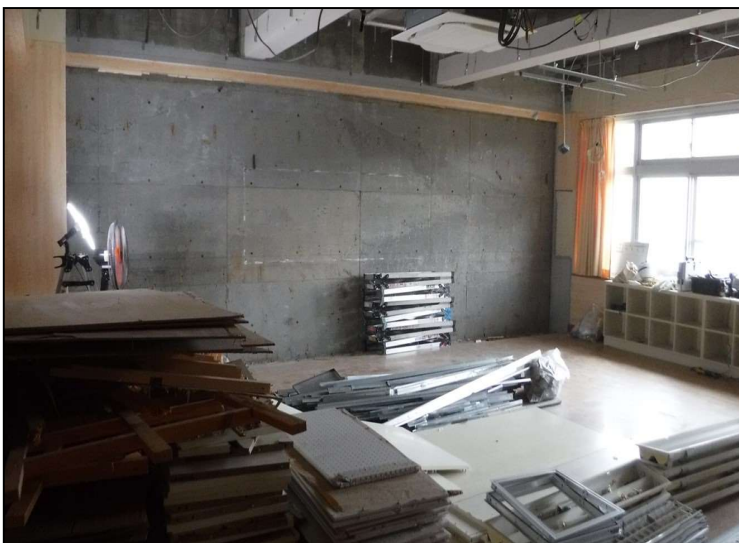


No.6  
調布市立多摩川小学校普通教室整備工事  
内装 撤去状況



No.7  
調布市立第五中学校多目的室空調整備工事  
空調機設置 完了状況



No.8  
調布市八ヶ岳少年自然の家受変電設備改修工事  
基礎工事 施工状況

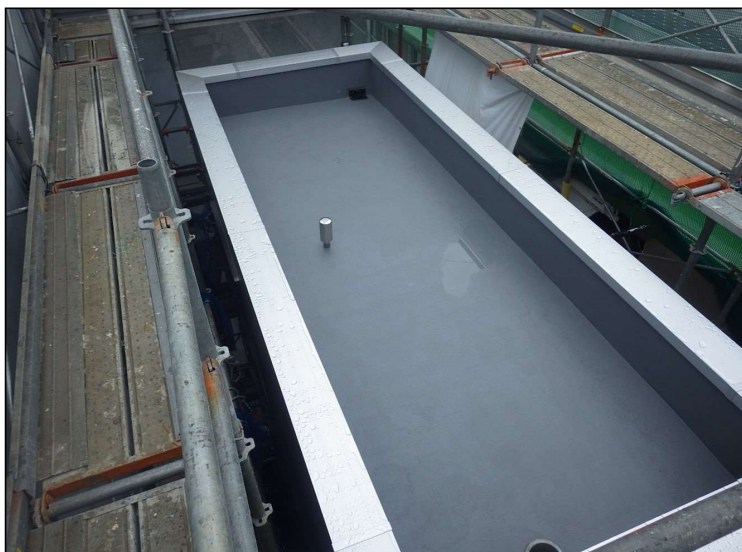

No.9  
調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事  
屋上防水 施工状況



No.10

調布市佐須ふれあいの家・調布市立佐須児童館・  
調布市立図書館佐須分館外壁及び屋上防水改修工事

外壁工事 施工状況



No.11

調布市北部公民館外壁改修工事

外壁工事 完了状況



No.12

調布市八ヶ岳少年自然の家体育館外部改修工事

外壁工事 施工状況
