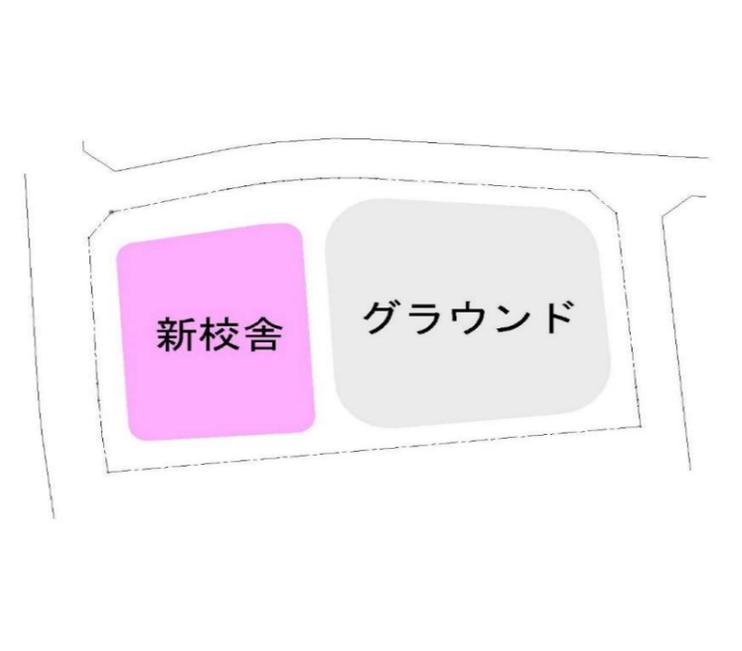
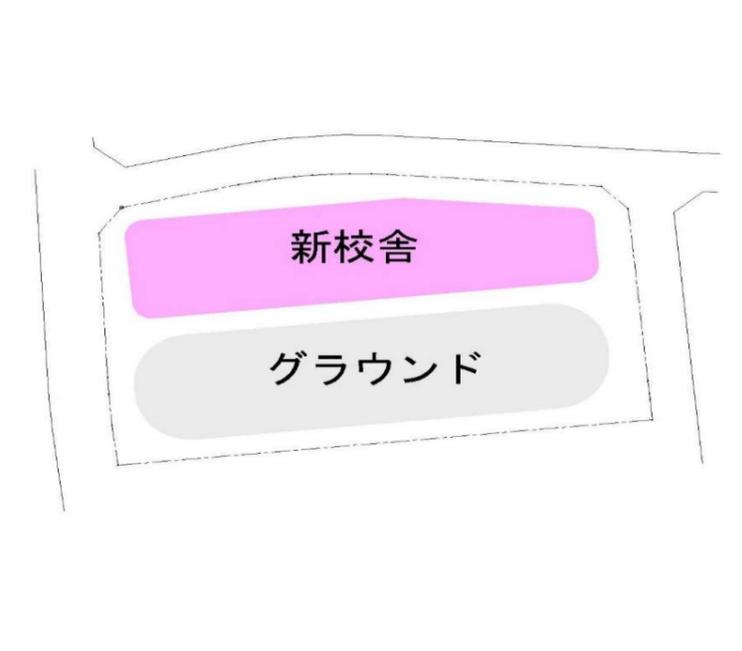
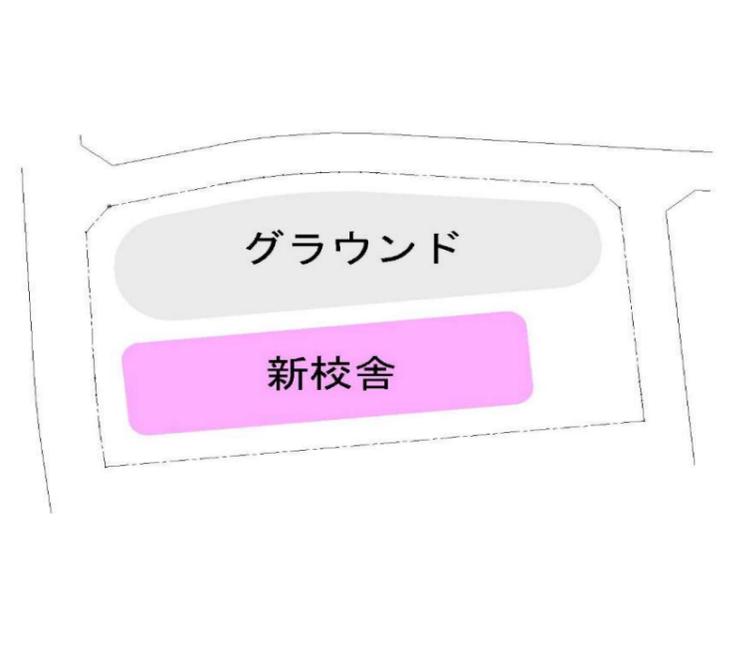


校舎配置計画比較検討（案）

◎：優れている ○：やや優れている △：普通 ×：劣っている

		A案		B案		C案		
校舎配置イメージ								
特徴	工事中	騒音・振動・粉塵	他案に比べ比較的小さい	△	他案に比べ最大	×	他案に比べ仮設校舎の解体が無い	×
		グラウンド利用	利用できない ×					
		体育館利用	利用できる ◎					
	工事期間	B案に比べ若干短い（想定42ヶ月）	△	他案に比べ最長（想定45ヶ月）	△	他案に比べ最短（想定36ヶ月）	○	
	整備後	グラウンドのゆとり	160mトラック	△	170mトラック	○	170mトラック（但し校舎の日影の影響あり）	△
		教室・給食配膳動線	メイン動線が南北方向のため、動線距離が比較的短い	◎	メイン動線が東西方向のため、動線距離が長い	△	メイン動線が東西方向のため、動線距離が長い	△
	その他	近隣への影響（日影）	校舎配置が東西方向が短いがやや影響あり	○	他案に比べ最大	×	校舎南配置のため影響なし	◎
		仮設校舎の必要性	一部（ハチの巣の部分）	△	全校舎	×	無い	◎
		引越し回数	2回（一部引越し）	△	2回（全校）	×	1回	○
