資料 2

令和8年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和8年10月10日現在　　教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日 工期	受注者	進捗率 今回	進捗率 前回	備考
1	調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館施設整備PFI事業	校舎・図書館の新築工事	12,980,615,450円 内 建設工事 10,495,763,300円	R6.9.25 R6.9.26 ～ R24.3.31 (建設工事 R11.1.31)	PFI調布小・中学校・図書館施設整備㈱	19%	17%	参考写真 No.1
2	調布市立第三中学校防災盤ほか改修工事	防災盤等更新工事	15,576,000円	R8.5.19 R8.5.20 ～ R8.10.30	㈱葉月商会	100%	95%	完了検査 10月9日 参考写真 No.2
3	調布市立飛田給小学校体育館内部改修工事	体育館内部改修工事及び機械設備工事	96,679,000円	R8.5.20 R8.5.21 ～ R9.1.22	㈱ライフスタイル	80%	50%	参考写真 No.3
4	調布市立飛田給小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事	体育館内部改修に伴う電気設備工事	48,224,000円	R8.5.20 R8.5.21 ～ R9.1.22	三盛電設㈱	40%	15%	
5	調布市立調布中学校体育館外部改修工事	体育館外部改修工事	94,490,000円	R8.5.22 R8.5.25 ～ R9.2.26	㈱川又工務店	30%	21%	参考写真 No.4
6	調布市立杉森小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	23,749,000円	R8.5.25 R8.5.26 ～ R9.2.26	深電工業㈱	5%	3%	
7	調布市立第五中学校普通教室空調機更新工事	空調機更新工事	54,120,000円	R8.5.29 R8.6.1 ～ R8.10.19	東和空調㈱	100%	90%	完了検査 10月1日
8	調布市立第二小学校給食室改修工事	給食室改修工事	149,490,000円	R8.6.2 R8.6.3 ～ R9.3.23	㈱貴建築工房	25%	15%	参考写真 No.5
9	調布市立第二小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	27,335,000円	R8.6.2 R8.6.3 ～ R9.3.23	深電工業㈱	20%	10%	

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日 工期	受注者	進捗率 今回	進捗率 前回	備考
10	調布市立第二小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	176,000,000円	R8.6.2 R8.6.3 ～ R9.3.23	宮沢設備工業㈱	15%	10%	
11	調布市立布田小学校校庭整備工事	校庭整備工事	68,508,000円	R8.6.10 R8.6.11 ～ R8.10.30	㈱井上グランド施設工事	65%	60%	参考写真No.6
12	調布市立緑ヶ丘小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	24,530,000円	R8.6.15 R8.6.16 ～ R9.3.18	㈱葉月商会	80%	3%	
13	調布市立第三中学校給水設備改修工事	給水直結化工事	48,510,000円	R8.6.17 R8.6.18 ～ R9.2.26	㈱あかつき設備	50%	14%	
14	調布市立神代中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	21,208,000円	R8.6.17 R8.6.18 ～ R9.3.18	園部電設㈱	0%	0%	
15	調布市立調布中学校普通教室改修工事	普通教室改修工事	68,970,000円	R8.6.22 R8.6.23 ～ R9.3.18	㈱久保工務店	25%	15%	参考写真No.7
16	調布市立第六中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	17,925,600円	R8.6.23 R8.6.24 ～ R9.3.18	園部電設㈱	0%	0%	
17	調布市立第八中学校普通教室改修工事	普通教室改修工事	47,410,000円	R8.6.29 R8.6.30 ～ R9.2.5	㈱G－BANK	50%	15%	
18	調布市立第七中学校普通教室改修工事	普通教室改修工事	37,290,000円	R8.7.1 R8.7.2 ～ R9.2.26	㈱東京建設コンサルタント	50%	20%	
19	調布市立八雲台小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	33,550,000円	R8.7.1 R8.7.2 ～ R9.3.18	㈱三誠	0%	0%	

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日 工期	受注者	進捗率 今回	進捗率 前回	備考
20	調布市立滝坂小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	26,950,000円	R8.7.6 R8.7.7 ～ R9.3.18	小林電気㈱	0%	0%	
21	調布市立第三中学校LED化改修工事	校舎LED化改修工事	61,303,300円	R8.7.6 R8.7.7 ～ R9.3.18	いわき電工㈱本店	60%	10%	
22	調布市立第一小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	33,550,000円	R8.7.8 R8.7.9 ～ R9.3.18	㈱大東電設	0%	0%	
23	調布市立調和小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	97,841,700円	R8.8.21 R8.8.24 ～ R9.9.30	㈱磯原電気	0%	0%	
24	調布市立第三小学校南校舎空調設備改修工事	空調設備改修工事	22,984,500円	R8.9.16 R8.9.17 ～ R9.2.19	㈱二十二設備	0%	－	
25	調布市立第三小学校校庭整備工事	校庭整備工事	57,530,000円	R8.10.8 R8.10.9 ～ R9.2.19	㈱鈴清土木	0%	－	
26	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事	遺跡ガイダンス施設の新築工事	323,400,000円	R7.12.18 R7.12.19 ～ R8.12.11	相互建設㈱	52%	43%	参考写真No.8
27	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築に伴う電気設備工事	遺跡ガイダンス施設の新築に伴う電気設備工事	44,968,000円	R7.12.18 R7.12.19 ～ R8.12.11	㈱磯原電気	25%	16%	
28	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築に伴う機械設備工事	遺跡ガイダンス施設の新築に伴う機械設備工事	53,625,000円	R7.12.18 R7.12.19 ～ R8.12.11	宮沢設備工業㈱	20%	12%	
29	調布市立図書館宮の下分館改築工事	図書館分館の改築工事	301,400,000円	R7.12.18 R7.12.19 ～ R9.1.8	林建設㈱	65%	56%	参考写真No.9

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日 工期	受注者	進捗率 今回	 前回	備考
30	調布市立図書館宮の下分館改築に伴う電気設備工事	図書館分館の改築に伴う電気設備工事	58,448,500円	R7.12.18 R7.12.19 ～ R9.1.8	㈱磯原電気	25%	20%	
31	調布市立図書館宮の下分館改築に伴う機械設備工事	図書館分館の改築に伴う機械設備工事	40,497,600円	R7.12.18 R7.12.19 ～ R9.1.8	㈱あかつき設備	20%	15%	
32	調布市立図書館神代分館空調設備改修工事	空調設備改修工事	22,914,100円	R8.8.31 R8.9.1 ～ R9.2.26	㈱二十二設備	0%	0%	
33	調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第２期)	遺跡公園等整備工事	249,700,000円	R8.9.29 R8.9.30 ～ R9.10.15	共伸建設㈱	0%	－	



No.1

調布市立若葉小学校・第四中学校・
図書館若葉分館施設整備PFI事業

中学校校舎棟（写真左上）・地上3階柱壁　施工状況
小学校校舎棟（写真左下）・地上4階床梁　施工状況
アリーナ棟（写真中央）・地上3階床梁　施工状況



No.2

調布市立第三中学校防災盤ほか改修工事

防災盤　設置完了



No.3


調布市立飛田給小学校体育館内部改修工事

アリーナ内部　施工状況



No.4
調布市立調布中学校体育館外部改修工事

体育館屋根　施工状況

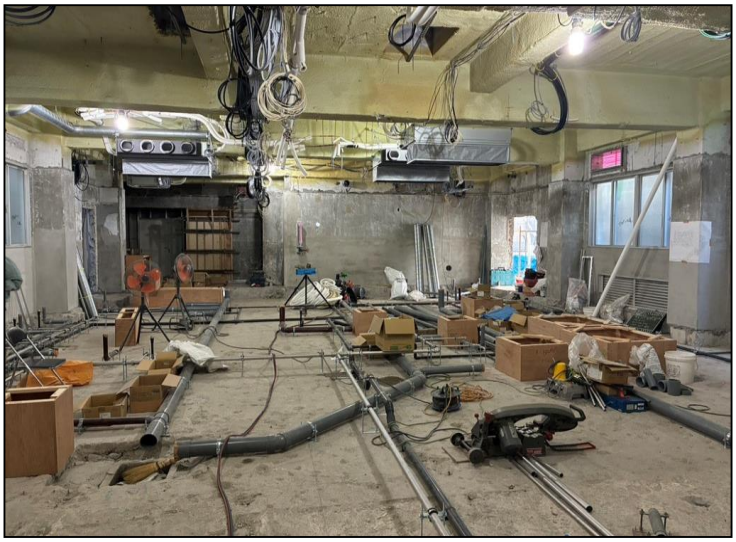

No.5
調布市立第二小学校給食室改修工事

給食室配管　施工状況



No.6
調布市立布田小学校校庭整備工事

校庭内　施工状況



No.7
調布市立調布中学校普通教室改修工事

教室内部　施工状況



No.8
（仮称）調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事

建物内部　施工状況



No.9
調布市立図書館宮の下分館改築工事

屋上防水　施工状況
