**資料１**

令和５年１２月１１日
文教委員会資料
教育部教育総務課

# 若葉小学校不足教室対策及び若葉小・第四中学校施設整備ＰＦＩ事業に係るこれまでの経過

## 若葉小学校校舎増築工事

配置図




| | | 後期基本計画 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 令和元年度 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 |
| 当初計画（平成３０年度時点） 校舎増築 | | 施設整備在り方検討 | 実施設計 | 工　事 | | 供用開始 → | | | | | |
| | | | | ★不足教室の発生 | | | | | | | |
| 仮設校舎 | | | 建築 ⇢ | 賃貸借 → | | 解体 | | | | | |
| 計画修正 | | | | | | | | | | | |
| 令和２年度当初 校舎増築 | | 施設整備在り方検討 | 検討 | 実施設計 | 工　事 | | 供用開始 → | | | | |
| 仮設校舎 | | | 建築 ⇢ | 賃貸借 → | | | 解体 | | | | |

※賃貸借期間の変更　：　２年間　⇒　３年間

計画変更

## 若葉小・第四中・若葉分館 一体的施設整備（施設複合化）

配置図

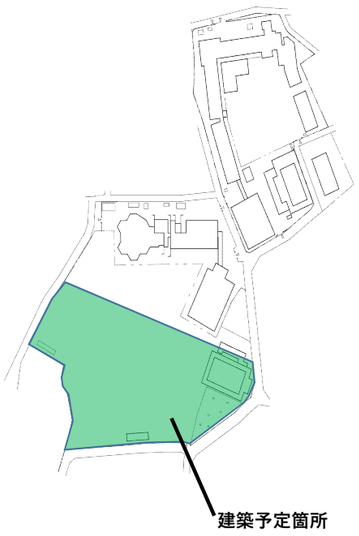


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 令和元年度 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 |
| 現計画（令和２年度下半期時点） 校舎改築 | | | | 基本構想 | 基本計画・ＰＦＩ事業者選定 | | 実施設計 | 工　事 | | 供用開始 → | |
| | | | | | 支援業務委託 | 支援業務委託 | | | | | |
| 仮設校舎 | | | 建築 ⇢ | 賃貸借 → | | | 解体 | | | | |
| 現時点における進捗 校舎改築 | | | | 基本構想 | 基本計画・ＰＦＩ事業者選定 ★入札公告 | ★契約締結 | 実施設計 | 工　事 | | 供用開始 → | |
| | | | | | | ・議案第６６号一般会計補正予算（第４号）　債務負担行為の設定 | | | | | |
| | | | | | 支援業務委託 | 支援業務委託 | | | | | |
| | | | | | | 委託期間　延伸 ⇢ | | | | | |
| | | | | | | ・議案第６６号一般会計補正予算（第４号）　増額補正及び繰越明許費の設定 | | | | | |
| 仮設校舎 | | | 建築 | 賃貸借 → | | 取得 | 継続使用 → | | | | 解体 |
| | | | | | | ・議案第８２号財産の取得について | | | | | |
